

Status sjøledning og nye pumper 10.06.22

Gravearbeider, legging, nedspyling og tilkopling til Kommunalt anlegg på Solløkkasiden ble utført i april-mai av Arne Rød AS. Arbeidet er så langt utført inn forbi kostnadsrammer og tillatelser gitt av Sandefjord kommune og Statsforvalter.

Ny Ø110 ledning er gravd/spylt ned i områder med grunt vann. Trase avviker litt fra gjengitt (grønt på tegning, ligger noe mer mot gult). Ledning vil bli innmålt og kontrollert. Samtidig sjekker vi tilstand til gammel ledning – den blir som kjent liggende som “reserve”

Beklageligvis har levering pumpe blitt kraftig forsinket. Ikke helt ukjent i leverandørindustrien i dag. Men, med alt levert satser vi på å fullføre siste uke i juni. Det kan bli noen timer nedetid ved omkopling.






Nytt anlegg 2021-22.

Kommunal søknad ble sendt inn 22.06.21.

Ny ledning har dia 110mm og pumpene er av mer robust karakter (skyve – ikke skru) med kapasitet 2x 7l/s. Dette skal med margin dekke dagens og fremtidig behov.

Ansvarlig for prosjektering og søknad er VA Consult, Grundfos på teknisk installasjon og igangkjøring pumper, Arne Rød på sjøledning og graving.

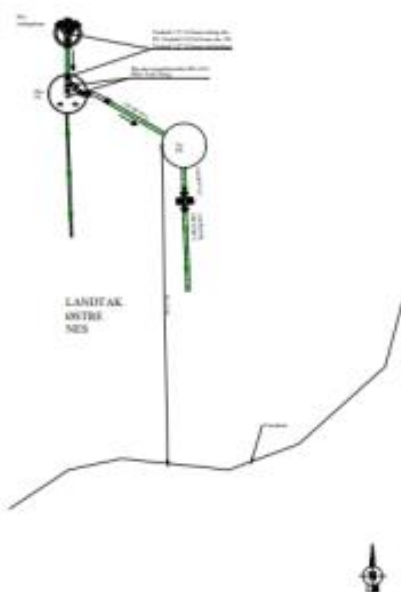

Det legges opp til en ny kum under bakkenivå i samme område samt nytt styreskap.

Gammel ledning forutsettes liggende. Det arrangeres foreløpig for alternativ ruting ny kum eller gammel (som back up).

Det legges opp til minst mulig nedetid – antatt 1 dag sent høst eller tidlig vinter (etter stengning sommervann)

Sjøledning blir spylt ned i søla de siste (ca) 100m mot land begge sider.

Det har vært en ganske omfattende prosess med nabovarsler, kystverk, 100m belte, sårbar bløtbunn og ålegrass for å nevne noe.

Vi er selvfølgelig avhengig av kommunal godkjenning uten vesentlige kommentarer til prosjektet.



Rev.	Endring	Dato	Tegn.	Kontroll
ØSTRE NES VA ANLEGG SA		BYGGEMELDING		
SITUASJONSKART EKS PUMPESTASJON OG SJØLEDNING TRASÉ EKS. SJØLEDNING		Tegn. DOK	Ans. RTC	Kont. RTC
		14.02.2018	10.06.2021	10.06.2021
		Prosjekt nr.	Tegn. nr.	Rev.
		14028	H4.30	
VA CONSULT		VA CONSULT AS Tlf: 479 23 600 www.nasconsult.no		

Dagens situasjon.

Kloakk fra 120 hytter ender ved pumpestasjon Østre Nesvei, ved bommen.

En inntakskum samler 3 forgreninger som så går videre til pumpekum. I tillegg har vi en spylekum (vann) rett ved.

To skrupumper med kapasitet 2,5 og 3,5 l/s pumper via en 63mm dia og 752m lang sjøledning kloakken til Solløkka, kommunal pumpestasjon.

Kapasiteten er tidvis på bristepunktet og vi har hatt gjentatte stopp/kloakk til sjø – 5 stk siden siste general forsamling. Ofte i sammenheng med store nedbørsmengder (overvannsproblematikk)

Anlegget er fra 1992 og ikke prosjektert for dagens – eller fremtidens antatte bruk av hyttene.

